

(一報 二報 三報)

所 名 高松 SC

発生日時 8 月 14 日 12 時 10 分

事業主労災

報告書作成 8 月 17 日 19 時 30 分

工事名	SEHARUYA松山北井門2丁目店 排水詰まり除去工事 (Aタイプ)	工事番号	218274914	SC,ST長名	長山	SC,ST名	高松
発注者	(株)セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021/8/13~2021/8/14	進捗率	100	%	

状

(根本原因)


- ・洗浄ノズルの挿入先端が排水管口から吐出させたことで噴出しを予防するため手で押さえたこと
- ・高圧洗浄の管ルートの端末口を閉塞させる等の噴出し予防を行わないまま作業を進めたこと

況

(根本原因)

- ・高圧洗浄作業時には、吹き上がり防止を手ではなく、風船等を用いた管口隙間を閉塞養生を行うこと。
- ・洗浄ノズル等の取扱いは、手袋等の保護具を着用して行うこと。
- ・改善した配管ルート以外の詰まり点検結果や懸念を店舗へ説明してから作業を完了させること。

災害発生状況図(平面図)

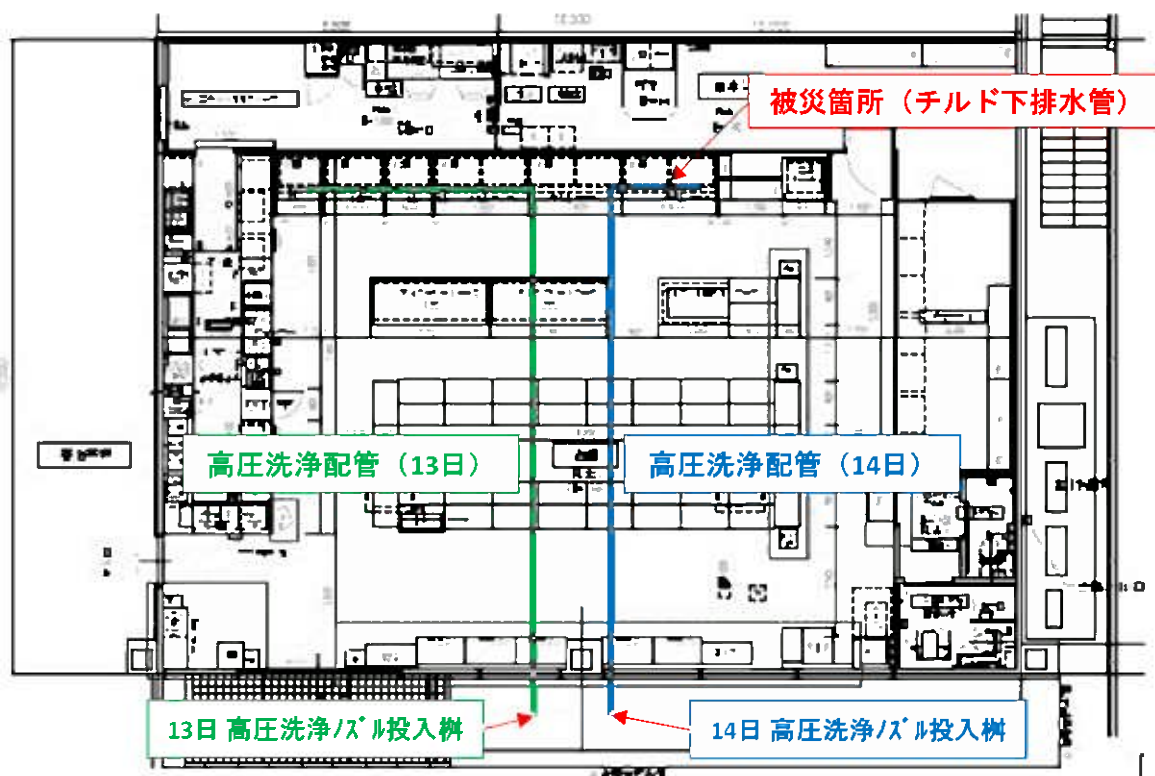

【写真】



店舗全景



14日 高圧洗浄機投入樹

13日 高圧洗浄機投入樹



排水管漏れ箇所



トローラー先端部と手のひらの接触

チルド下埋設排水管
