

労働災害・第三者災害・トラブル 発生報告書

(一報 二報 三報)

所 名 横浜 SC 八王子サテライト

発生日時 12月10日 10時30分

報告日時 12月15日 18時00分

工事名	SE狛江駒井町3丁目店 スムーザーマシン設置に伴う電気工事	工事番号	217033928	SC,ST長名	八巻宏治	SC,ST名	八王子
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年12月10日～2021年12月10日	進捗率	100	%	



(根本原因)

- ・コンセント取付位置の材厚さに合わせた固定ビスの選定をしないまま作業を進めたこと。
- ・作業前に電源作業の要件(取付位置・ビス長さ・配線材等)、懸念事項が通知・共有されていないこと
- ※ 天板材厚 24mm:人工大理石 9mm+補強材 15mm、使用ビス長 16mm


(再発防止策)

- ・計画と相違した取付位置や取付母材厚さが不明な時はST担当等へ連絡協議、指示により進めること
- ・電源作業の要件(取付位置・ビス長さ・配線材等)、懸念事項を協議、検証して作業前に通知すること

災害発生状況図(平面図)

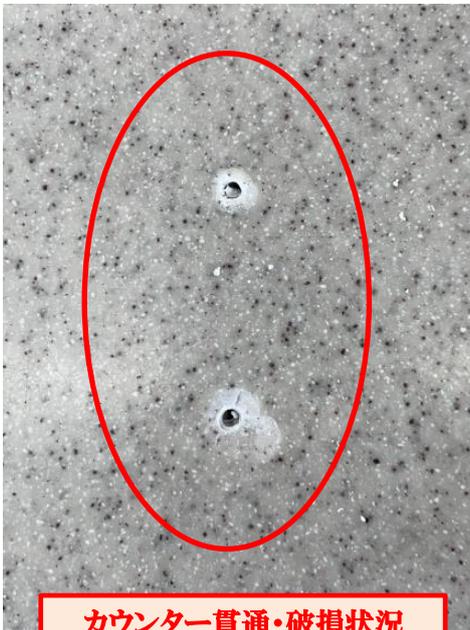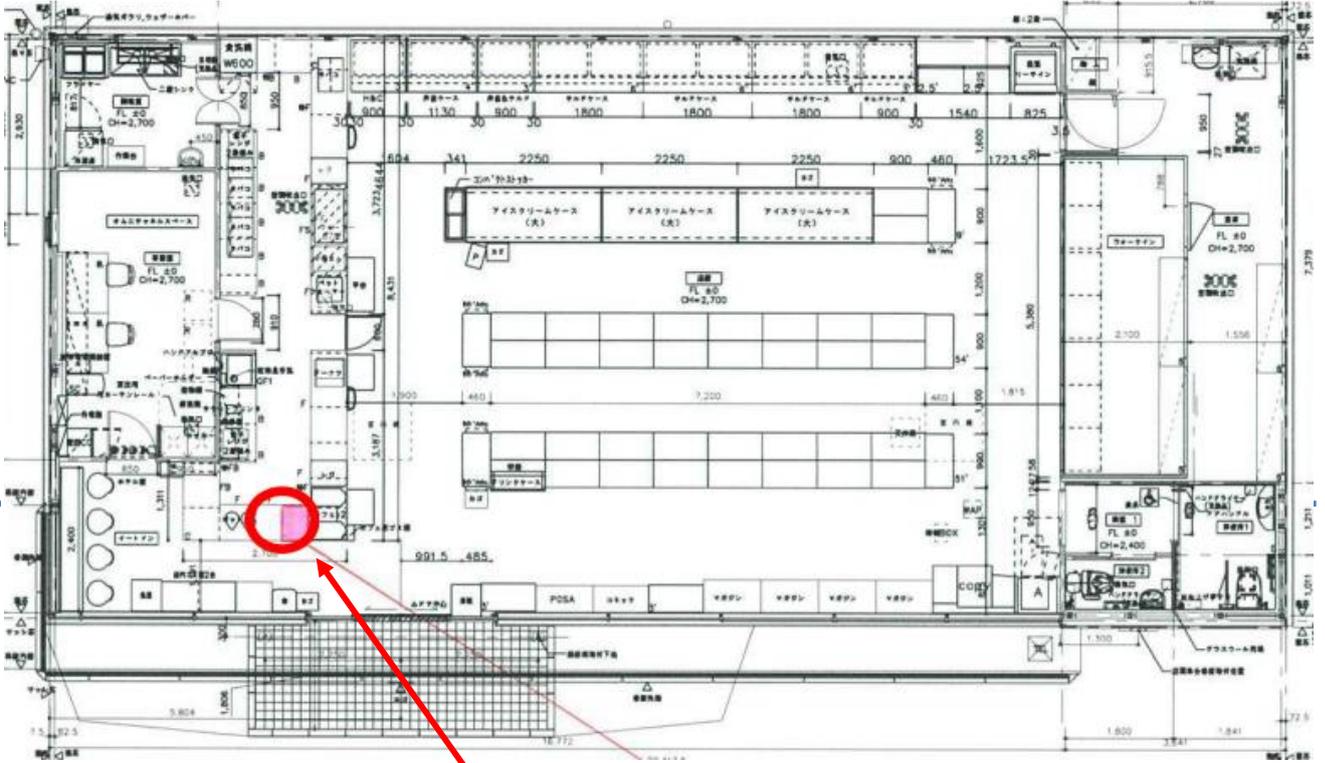

カウンター貫通・破損状況

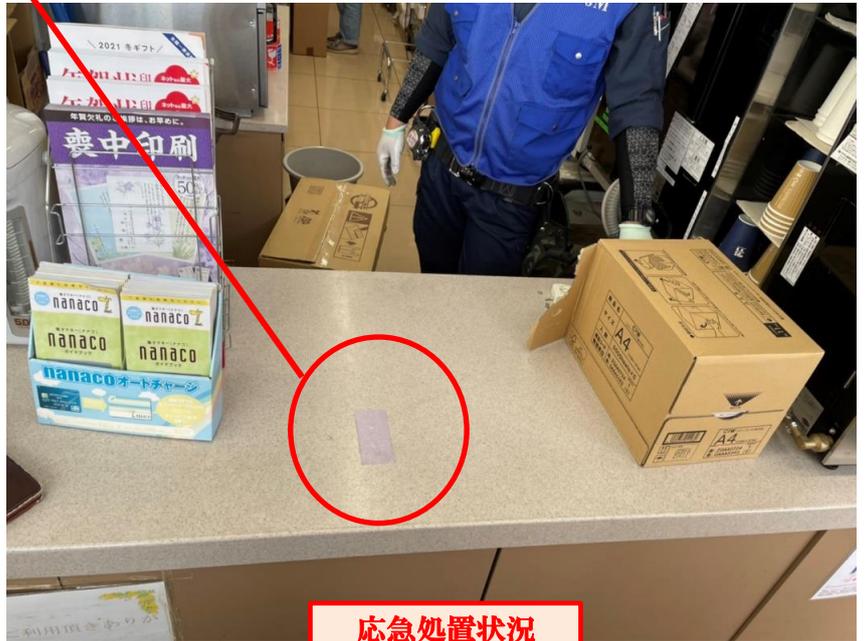

応急処置状況
