

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)


所 名 大阪 SC 姫路 ST

発生日時	12 月 16 日 12 時 50 分
報告書作成	12 月 22 日 11 時 00 分

工事名	SE相生竜泉店 舗装打替えに伴う配管補修工事	工事番号	210104290	SC,ST長名	北野	SC,ST名	姫路
発注者	前田道路株式会社	工 期	2021/12/16	進捗率	100	%	

状	(根本原因) - 給水管の接合部を保護、接触させない行動がされないまま布設替え作業を進めたこと。 - 給水布設作業は繁忙時間を休止する等の計画を見直されないまま作業を進めていたこと。
	(再発予防策) - 事前の計画で既設給水管への影響を考慮した掘削、配管取り扱いがなされていないこと。 - 漏水事故を懸念した作業の進め方を店舗と連携して進めていないこと(事前説明、作業時間帯等、報告遅延)

災害発生状況図(平面図)

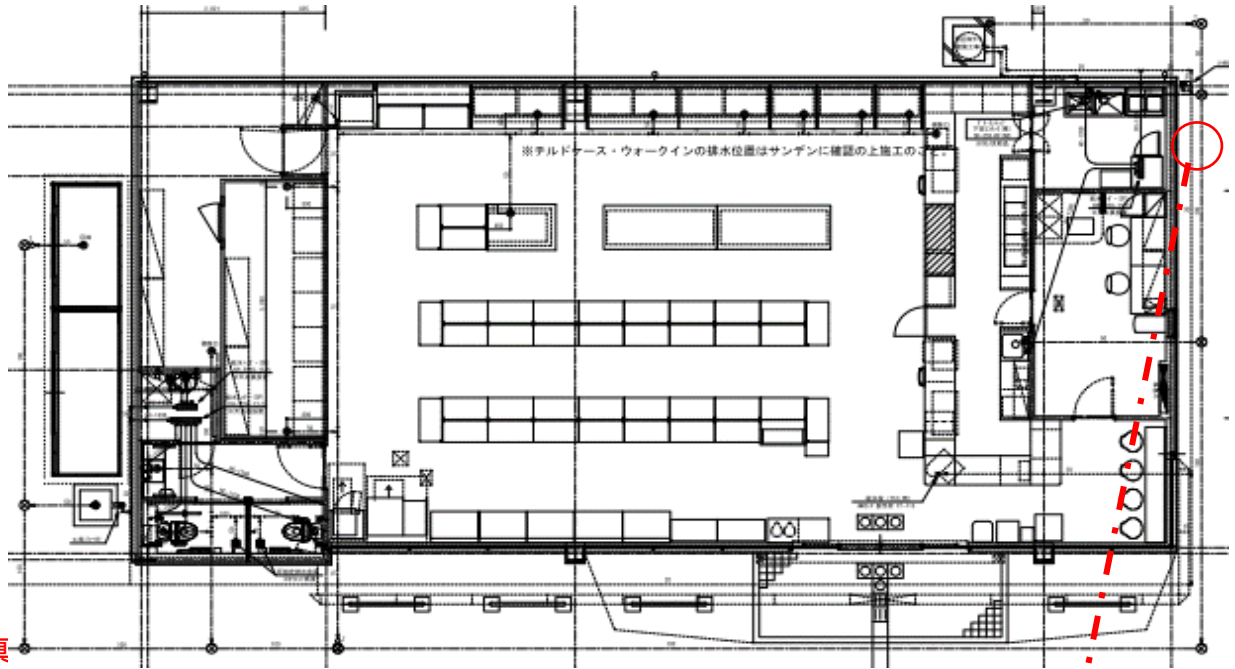

【写真】



埋設管破損箇所



SEJ外構埋設給水管破損



チーズ管とL管の接続部抜け



補修、施工後
