

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15


(一報 二報 **三報**)

所 名 大阪 SC 姫路 ST

発生日時 6 月 22 日 17 時 28 分

報告書作成 6 月 24 日 17 時 00 分

工事名	SE姫路船丘町店 コンパクトストッカー増設に伴う電源工事	工事番号	210043765	SC.ST長名	北野	SC.ST名	姫路
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	令和3年6月22日	進捗率	100	%	

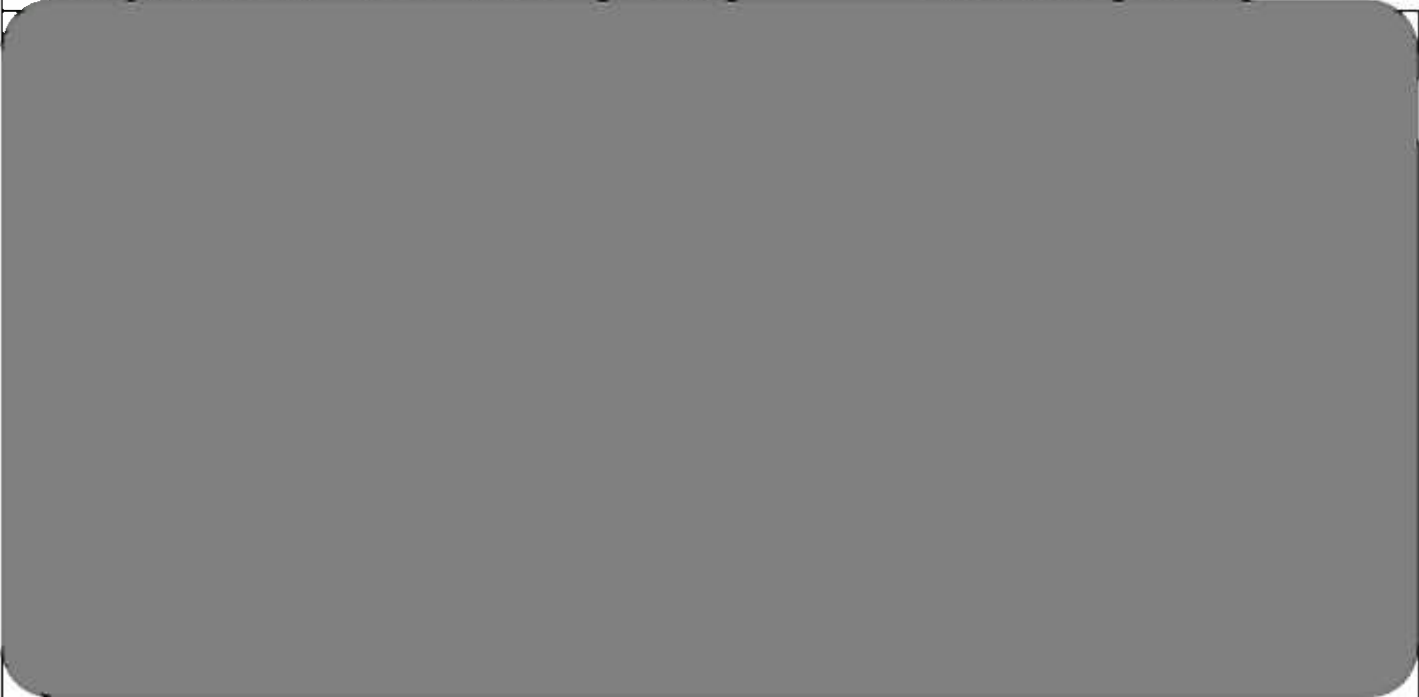

状

(根本原因)

- ・工事仕様の変更要望を上司に報告・相談せずに電工が判断して独自に進めていること
- ・手配作業者: 藤井に作業変更への対応や点検・報告通知の教育をしないまま単独で作業させたこと
- ・作業完了時の機能点検を行わないまま、作業完了・退店していること

(再発予防策)

- ・作業者の手配適否をST長、SC長は確認、立会を含めた施工体制を承認して作業を開始すること
- ・過去の事例から、事前説明・作業変更・完了点検等の対策を通知、実施状況を電子帳票で報告させる




災害発生状況図(平面図)

【写真】



電源停止のアイスケース

埋設管立ち上げ箇所

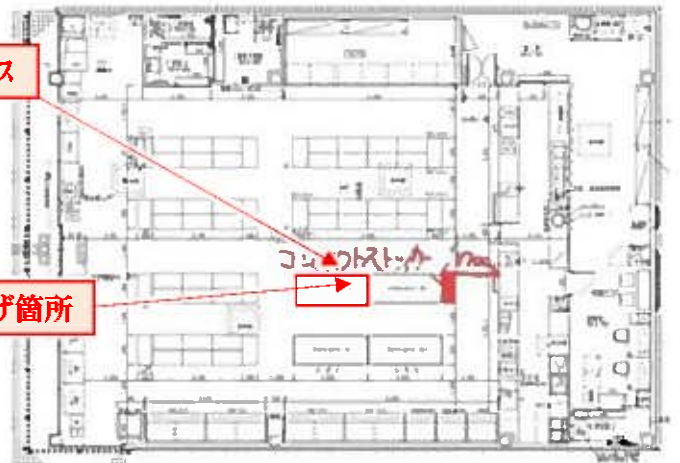

アイスケースと床の離隔：30mm



電源線の被覆破損





芯線の破損状況



OFFになったブレーカー



応急処置：絶縁テープ巻き

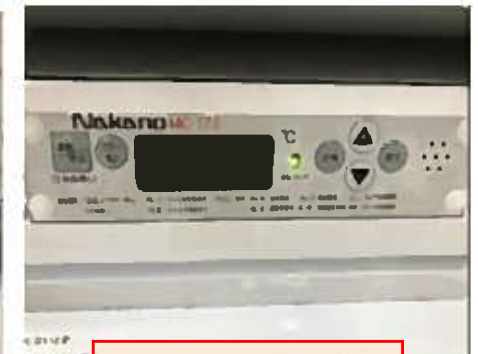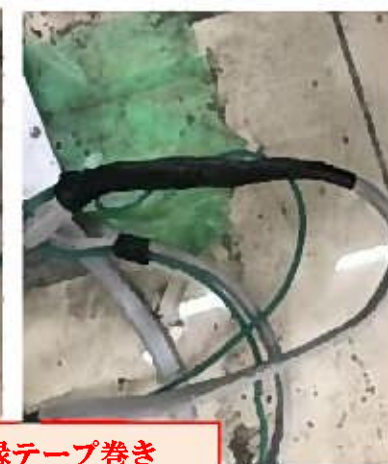

アイスケース電源の確認
